

Overeenkomst

Realisatie en beheer Wandelnetwerk en Toeristische Overstap Punten Zuid-Kennemerland



DE PARTIJEN:

- Gemeente Bloemendaal, vertegenwoordigd door wethouder N.A.L. Heijink
- Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door wethouder Mariëtte Sedee
- Gemeente Haarlem, vertegenwoordigd door wethouder R. Berkhout
- Gemeente Heemstede, vertegenwoordigd door wethouder N. Mulder
- Gemeente Velsen, vertegenwoordigd door wethouder B. Diepstraten
- Gemeente Zandvoort, vertegenwoordigd door wethouder E. Verheij-de Haas
- PWN, vertegenwoordigd door sectormanager J.M. van Wesemaal
- Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door gebiedsmanager A. Pander
- SBB, vertegenwoordigd door provinciehoofd Noord-Holland R. Tienkamp
- LNH, vertegenwoordigd door directeur E. Briët

EN Recreatie Noord-Holland, vertegenwoordigd door directeur drs. J. Gilliam.

OVERWEGENDE DAT:

1. De gemeenten samen werken in de Metropoolregio Amsterdam en dat in dat verband gestreefd wordt naar een uitstekend regionaal netwerk voor fietsen, wandelen en varen;
2. De samenwerkende partijen het belangrijk vinden om de dagelijkse leefomgeving prettiger en gezonder te maken en het investeringsklimaat te verbeteren voor onder meer de vrijetijdseconomie;
3. Het welzijn van inwoners gebaat is bij een aantrekkelijk aanbod om in de buitenlucht te bewegen;
4. Wandelaars een omvangrijke en belangrijke doelgroep vormen, die allerlei economische 'spin-off' genereren;
5. De regio door realisatie van een Wandelnetwerk met Toeristische Overstap Punten een bijdrage levert aan de spreiding van en promotie aan bezoekersstromen in de Metropool Regio Amsterdam.
6. De samenwerkende partijen en zich willen inspannen om een regionaal routenetwerk te realiseren dat aansluit op omliggende regio's en waarbij natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten ontsloten worden en zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van onverharde paden en boerenlandpaden;
7. De provincie Noord-Holland streeft in haar programma Natuurontwikkeling (PNO) naar een provincie dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van het wandelnetwerk Noord-Holland zoals beschreven op de website www.wandelnetwerknordholland.nl.
8. De provincie Noord-Holland streeft in haar programma PNO naar een evenwichtige spreiding van Toeristische Overstap Punten – kortweg TOP's – in de provincie.
9. De provincie voor beide beleidsdoelstellingen de subsidiëring Groen Noord-Holland uitvoert waarbij de inrichting van regionale wandelnetwerken tot 50% en TOP's tot 75% worden gesubsidieerd.

10. Recreatie Noord-Holland al regionale wandelnetwerken en TOP's voor groepen gemeenten en recreatieschappen heeft helpen realiseren of gerealiseerd in de Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar en Midden Kennemerland, Westfriesland, Laag-Holland, Gooi, Vecht en Diemen en Amsterdam-Amstelland.
11. Partijen al geruime tijd met elkaar in overleg zijn en begin 2019 een ontwerp en kostenraming voor realisatie, inrichting en beheer – kortweg Quick Scan - van het wandelnetwerk en TOP's in de regio Zuid-Kennemerland door Recreatie Noord-Holland, Routewerk, Fossa Nova en Lopende Zaken heeft laten opstellen;
12. Terrein beherende organisaties PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland bereid zijn ieder naar eigen draagkracht en mate van bereidheid medewerking te verlenen aan realisatie en operationeel onderhoud van het te realiseren Wandelnetwerk en TOP's in de regio Zuid- Kennemerland.
13. Recreatieschap Spaarnwoude 12 december 2019 ingestemd heeft om het beheer van de regionale routenetwerken voor wandelen, sloep varen en TOP's op te nemen in haar uitvoeringsprogramma voor wat betreft de bijdragen van de in het recreatieschap deelnemende gemeenten.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot doel om de afspraken tussen de samenwerkende partijen vast te leggen voor de realisatie en het beheer van een regionaal wandelnetwerk met TOP's voor de regio Zuid-Kennemerland, zoals uitgewerkt in de Quick Scan d.d. maart 2019.

Artikel 2 Verplichtingen van de samenwerkende gemeenten

1. Het meewerken aan de realisatie van het wandelnetwerk, door het op hun grondgebied toestaan dat informatiepanelen, keuze- en routepalen en TOP-zuilen worden geplaatst en dat routebewegwijzering wordt aangebracht op bestaande en op nieuw te plaatsen palen. Het genoemde terreinmeubilair mag conform artikel 2, lid 18, onder b en g van de bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht zonder omgevingsvergunning worden geplaatst.
2. Bij te dragen aan het beheer van het gerealiseerde wandelnetwerk en TOP's, zoals beschreven in bijlage 1.

Artikel 3 Verplichtingen van de samenwerkende terrein beherende organisaties

1. Het meewerken aan de realisatie van het wandelnetwerk, door het op hun grondgebied toestaan dat informatiepanelen, keuze- en routepalen en TOP-zuilen worden geplaatst en dat routebewegwijzering wordt aangebracht op bestaand terreinmeubilair en op nieuw te plaatsen palen. Het genoemde terreinmeubilair mag conform artikel 2, lid 18, onder b en g van de bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht zonder omgevingsvergunning worden geplaatst.
2. Terrein beherende organisaties zorgen voor het operationeel beheer en onderhoud van het wandelnetwerk in hun werkgebieden. Recreatie Noord-Holland levert hiervoor het materiaal aan (startpanelen, keuzepuntpalen, routepalen, aluplaatjes en stickers). De beheerders van de terrein beherende organisaties zoeken afstemming met de beheerder van Recreatie Noord-Holland.

Artikel 4 Verplichtingen van Recreatie Noord-Holland

1. Het coördineren van de realisatie en beheer van het Wandelnetwerk en TOP's Zuid-Kennemerland, gebaseerd op de Quick Scan van maart 2019, inhoudende:

- a. Het efficiënt en effectief inzetten van het projectbudget;
 - b. Het integreren van bestaande en al in aanleg zijnde wandelroutes;
 - c. Het aanvragen en naleven van provinciale subsidie voor het Wandelnetwerk en de TOP's;
 - d. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en toestemmingen;
 - e. Het maken en vastleggen van afspraken met grondeigenaren, terreinbeheerders en vergunningverlenende instanties;
 - f. Het zorgen voor uitvoering van de projectactiviteiten waaronder sanering van bestaande wandelbewegwijzering in de terreinen van de betrokken natuurbeheer organisaties;
 - g. Het zorgen voor uitvoering van beheertaken;
 - h. Het aanleveren van materiaal aan terrein beherende organisaties voor het operationeel beheer en onderhoud van het wandelnetwerk.
2. De realisatie uitvoeren binnen de door gemeenten en provincie beschikbaar gestelde budgetten.

Artikel 5 Looptijd

1. Deze overeenkomst is geldig voor de duur van de realisatiefase van het Wandelnetwerk en de TOP's gepland in de jaren 2020, 2021 en eindigend in 2022.
2. Indien het door onvoorziene omstandigheden niet lukt om de realisatiefase af te ronden in 2022 dan wordt de duur van de realisatiefase stilzwijgend verlengd tot het moment dat de inrichting voltooid is.
3. De Beheerfase van het Wandelnetwerk en TOP's vangt aan per 2022.
4. Het beheer wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en duurt totdat partijen anders besluiten. Indien een of meer gemeenten besluiten de overeenkomst met Recreatie Noord-Holland te beëindigen ontslaat dit de gemeente c.q gemeenten niet van de verplichting zoals beschreven in Artikel 5 lid 5.
5. Conform de subsidiebeschikking van de provincie Noord-Holland, zie bijlage 2, moet het Wandelnetwerk minimaal 15 jaar in stand gehouden worden en de TOP's minimaal 10 jaar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. De samenwerkende partijen doen bij deze afstand van alle aanspraken die zij tegenover elkaar zouden kunnen doen gelden, wegens schade geleden door de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming van één van de partijen en voor zover in deze overeenkomst niet anders is overeengekomen.
2. De samenwerkende partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden van welke aard ook, die met de uitvoering van deze overeenkomst in verband worden gebracht, behoudens indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming van één van de partijen en voor zover in deze overeenkomst niet anders is overeengekomen.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.








Artikel 8 Geschillen





Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen de samenwerkende gemeenten deze in der minne of zo nodig via mediation oplossen.

Artikel 9 Inwerkingtreding van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van deze overeenkomst door de samenwerkende gemeenten.

Aldus overeengekomen en ondertekend in november 2020

Partij	Naam ondertekenaar	Handtekening
<p>Gemeente Bloemendaal</p>  <p>Bloemendaal</p>	<p>wethouder N.A.L. Heijink</p>	
<p>Gemeente Haarlemmermeer</p>  <p>Gemeente Haarlemmermeer</p>	<p>wethouder Mariëtte Sedee</p>	
<p>Gemeente Haarlem</p>  <p>Gemeente Haarlem</p>	<p>wethouder R. Berkhout</p>	
<p>Gemeente Heemstede</p>  <p>Heemstede</p>	<p>wethouder N. Mulder</p>	
<p>Gemeente Velsen</p>  <p>GEMEENTE VELSEN</p>	<p>wethouder B. Diepstraten</p>	
<p>Gemeente Zandvoort</p>  <p>Gemeente Zandvoort</p>	<p>wethouder Ellen Verheij-de Haas</p>	
<p>PWN</p> 	<p>sectormanager J.M. van Wesemaal</p>	


<p>Natuurmonumenten</p> 	<p>Gebiedsmanager Aan Pander</p>	
<p>SBB</p> 	<p>provinciehoofd Noord- Holland R. Tienkamp</p>	
<p>LNH</p> 	<p>directeur E. Briët</p>	
<p>Recreatie Noord-Holland</p> 	<p>directeur drs. J. Gilliam.</p>	

Bijlagen:

1. Wandelnetwerk en TOP's Zuid-Kennemerland
2. Subsidiebeschikking provincie Noord-Holland sept 2020
3. Bestuursvoorstel AB SPW december 2019
4. Bestuursbesluit AB SPW december 2019

Bijlage 1

WANDELNETWERK EN TOP'S ZUID KENNEMERLAND

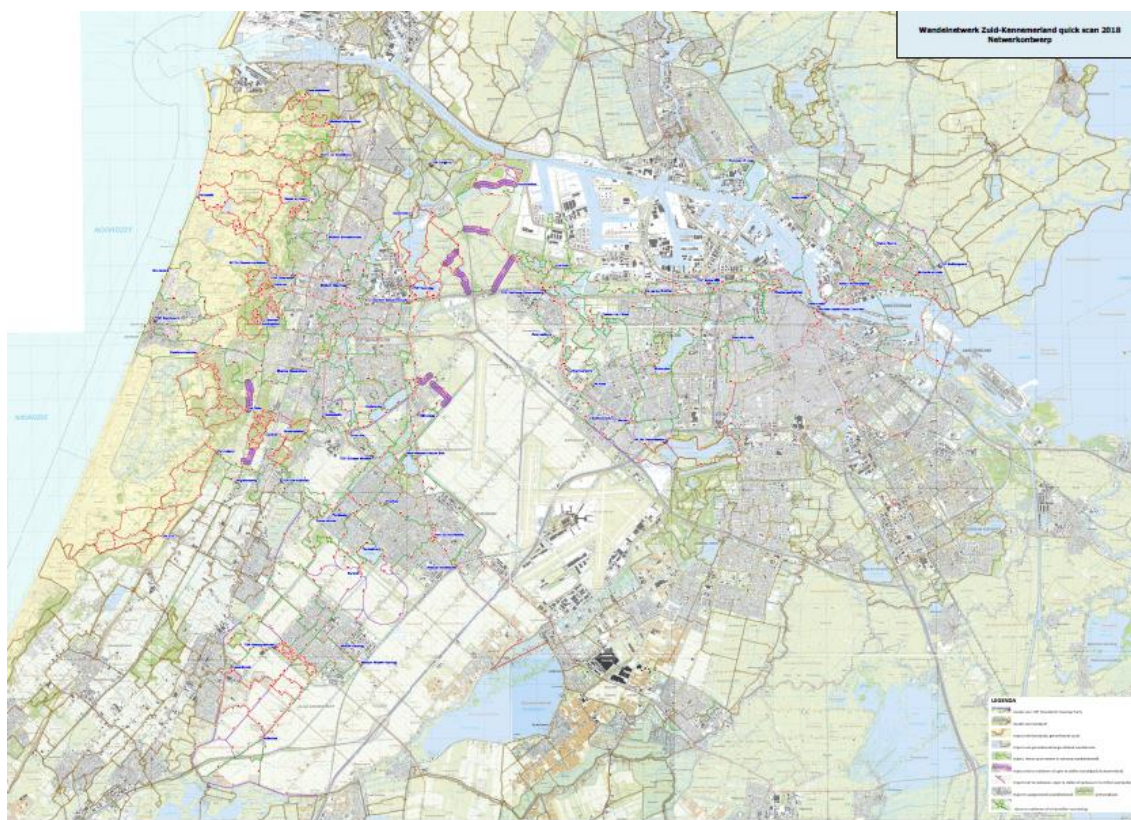

Verkleinde weergave van het schetsontwerp van december 2018.

Het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland reikt van de Noordzeekust en de provinciegrens met Zuid-Holland, door de westelijke tuinsteden tot aan de Westergasfabriek in Amsterdam West.

Gemeente Amsterdam doet voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw-West voorlopig niet mee. Er is een subsidieaanvraag ingediend zonder bijdrage van de gemeente Amsterdam.

**KOSTENVERDELING REALISATIE EN INRICHTING WANDELNETWERKEN EN TOP'S
(bedragen exclusief btw, prijspeil 2020 en 2021)**

WNW & TOP's Zuid Kennemerland (incl Amsterdam West)	Inrichtingskosten WNW €	kosten %	Inrichtingskosten TOP's €	Kosten %	Bijdrage Totaal €	gewogen %	Verschil tussen inrichtingskosten en bijdragen in €
Gemeente Amsterdam (West & Nieuwwest)	55.200,00	8,9%	7.500,00	5,0%	67.875,88	19,6%	-5.175,88
Gemeente Haarlemmeer	131.181,50	21,2%	11.250,00	7,5%	119.475,40	34,5%	22.956,10
Gemeente Haarlem	26.901,00	4,4%	3.750,00	2,5%	70.300,02	20,3%	-39.649,02
Gemeente Heemstede	10.237,00	1,7%	0,00	0,0%	14.891,14	4,3%	-4.654,14
Gemeente Bloemendaal	50.818,50	8,2%	7.500,00	5,0%	33.591,63	9,7%	24.726,87
Gemeente Zandvoort	23.912,50	3,9%	3.750,00	2,5%	26.319,22	7,6%	1.343,28
Gemeente Velsen	10.555,00	1,7%	3.750,00	2,5%	13.852,22	4,0%	452,78
Totaal gemeenten gewogen opp en inw					346.305,50	100,0%	
Totaal bijdrage gemeenten					346.305,50	45,1%	
Provincie NH (subsidie)	308.805,50	50,0%	112.500,00	75,0%	421.305,50	54,9%	0,00
Totaal	617.611,00	100,0%	150.000,00	100,0%	767.611,00	100,0%	0,00

In overleg met ambtelijk vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten is in een serie overleggen in 2018 en 2019 tot de hierboven weergegeven kostenverdeling voor inrichting van het regionale wandelnetwerk met TOP's gekomen. Er is een verdeelsleutel ontwikkeld waarbij iedere gemeente naar gewogen belang (gewogen %) bijdraagt aan de financiering voor inrichting en beheer van het wandelnetwerk en de TOP's. Hierbij telt het inwonertal en de oppervlakte van de gemeente mee. Een gemeente met een hoog inwonertal en een klein oppervlakte draagt relatief meer bij en een gemeente met een laag inwonertal en groot oppervlakte draagt relatief minder bij. Voor de gemeenten Amsterdam en Velsen zijn bijzondere uitgangspunten gehanteerd omdat deze gemeenten ook bijdragen aan de inrichting en beheer van wandelnetwerken in aangrenzende regio's. Voor Amsterdam is alleen gerekend met het inwonertal en het oppervlak van de stadsdelen West en Nieuw West. Voor Velsen is gerekend met de helft van het aantal inwoners en het gemeentelijk oppervlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland dat nog niet als regionaal wandelnetwerk is ingericht.

Betalingsregeling per gemeente voor de realisatie van het wandelnetwerk en TOP's:

Gemeente	Bijdrage 2019	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021
Haarlemmermeer	€ 75.000	€ 44.475	-
Haarlem	-	€ 70.300	-
Heemstede	-	€ 14.891	
Bloemendaal optie 1	-	€ 33.592	-
Bloemendaal optie 2	-	€ 16.796	€ 16.796
Zandvoort	-	€ 13.160	€ 13.160
Velsen	-	€ 3.750	€ 10.102

KOSTENVERDELING BEHEER EN ONDERHOUD WANDELNETWERK EN TOP'S (bedragen exclusief btw, prijspeil 2021)

Kosten beheer en onderhoud per jaar Zuid Kennemerland en Amsterdam-west						
	Totaal op basis van kilometers netwerk	Totaal op basis van oppervlakte en aantal inwoners	Totaal op basis van oppervlakte, inwoners en bijdrage NPZK beheerders en LNH landgoederen	inclusief 21% btw	percentage	verschil door bijdrage TBO's
Velsen	€ 2.887	€ 3.319	€ 3.040	€ 3.679	4,0%	€ 278
Haarlem	€ 8.912	€ 16.842	€ 15.429	€ 18.669	20,3%	€ 1.413
Zandvoort	€ 8.159	€ 6.305	€ 5.776	€ 6.989	7,6%	€ 529
Bloemendaal	€ 14.183	€ 8.048	€ 7.373	€ 8.921	9,7%	€ 675
Heemstede	€ 2.761	€ 3.568	€ 3.268	€ 3.955	4,3%	€ 299
Haarlemmermeer	€ 28.116	€ 28.624	€ 26.222	€ 31.728	34,5%	€ 2.402
Amsterdam west	€ 17.949	€ 16.262	€ 14.897	€ 18.025	19,6%	€ 1.364
Totaal	€ 82.967	€ 82.967	€ 76.005	€ 91.967	100,0%	€ 6.962

n.b. voor 2022 en de daaropvolgende jaren worden de beheerbedragen jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van RNH.

Berekende beheerkosten terrein beherende organisaties:

Totaal op basis van kilometers netwerk: De reëel berekende beheerkosten van het regionale wandelnetwerk.

Totaal op basis van oppervlakte en aantal inwoners: De reëel berekende beheerkosten toebedeeld aan de gemeenten op basis van het totaal gewogen belang per gemeente uitgedrukt in percentage van de totale kosten.

Totaal op basis van oppervlakte, inwoners en bijdrage NPZK-beheerders en LNH landgoederen. Op woensdag 22 mei 2020 is met Adviescommissie vertegenwoordigers van de samenwerkende terrein beherende organisaties en gemeenten in het NPZK gesproken. Besproken is dat de terreinbeheerders zelf het onderhoud van het routenetwerk in het Nationaal Park willen uitvoeren. Door Landschap Noord-Holland is bevestigd dat ook zij het operationeel onderhoud binnen hun gebieden zelf willen uitvoeren volgens dezelfde uitgangspunten als voor het NPZK zijn gehanteerd. Met Waternet (beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen is afgesproken dat het Wandelnetwerk Noord-Holland tot aan de grenzen van hun terreinen loopt en dat in de Amsterdamse Waterleidingduinen de eigen routemarkering van Waternet wordt gehandhaafd.

Gevraagd is of Recreatie Noord-Holland de benodigde startpanelen, palen en stickers ter beschikking wil stellen, meldingen wil doorgeven zodat de terreinbeheerders dan met hun eigen mensen en vrijwilligers de benodigde onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Berekend is welke kosten Recreatie Noord-Holland dan kan besparen op de totaal berekende beheerkosten, resulterend in een totaalbedrag van € 6.962. Die besparingen zijn dan per gebiedsbeheerder weergegeven op de drie onderscheiden beheeraspecten: coördinatie en registratie, inspectie en onderhoud.

De terrein beherende organisaties leveren hun diensten in natura. Dit rekenblad geeft de terrein beherende organisaties een indicatie van de kosten die zij kunnen verwachten voor het beheer en onderhoud van het wandelnetwerk binnen hun terreinen. De werkwijzen en kostenstructuren van terrein beherende organisaties verschillen, waardoor de kostprijs van de een verschilt ten opzichte van de ander.

Jaarlijks zullen de beheerlasten worden geïndexeerd op basis van een door de directie van Recreatie Noord-Holland vast te stellen indexcijfer.

Subsidiebeschikking provincie Noord-Holland 16 september 2020



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Recreatie Noord-Holland NV
Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon
mw. A. de Groot
CZ/SI/SU

Telefoonnummer +31235143747
groota@noord-holland.nl

1 | 4

Betreft: Verlenen subsidie
Project: Realisatie wandelnetwerk en TOP's in Zuid Kennemerland

Verzenddatum

16 september 2020

Geacht bestuur,

Kenmerk

1435101/1477975

Op 28 mei 2020 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U vraagt deze subsidie aan voor uw project 'Realisatie wandelnetwerk en TOP's in Zuid Kennemerland'. Op 16 juni 2020 hebben wij per e-mail uw aangepaste begroting ontvangen. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag € 616.860,-. U vraagt een subsidie aan van € 340.930,-.

Uw kenmerk U20200508

Subsidieverlening

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de paragrafen 3 en 4 van de uitvoeringsregeling. Gelet op artikel(en) 3.1 en 4.1 van de uitvoeringsregeling hebben wij dan ook besloten uw organisatie een subsidie te verlenen voor uw project 'Realisatie wandelnetwerk en TOP's in Zuid Kennemerland'.

Berekening subsidie

Deze subsidie bedraagt in totaal € 340.930,-.

De subsidie is als volgt berekend:

Voor realisatie van het wandelnetwerk: 50% van de subsidiabele kosten.
U geeft aan dat de totale investeringskosten € 486.860,- bedragen.
50% van € 486.860,- is € 243.430,-

Voor realisatie van de toeristische overstappunten 75% van de totale subsidiabele kosten (€ 130.000,-) is € 97.500,-

BTW

U geeft aan dat de btw-kosten voor uw organisatie zijn te verrekenen of te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen btw-kosten opgenomen.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Verplichtingen

Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:

- U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten van de activiteiten zo snel mogelijk maar *uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit* aan ons te melden;
- U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op de begroting *vooraf* aan ons te melden;
- voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruikt u de formulieren voor 'Voortgang project en melden wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies' (www.noord-holland.nl) onder 'Algemene subsidieformulieren'. Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;
- U dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord-Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar de logo's;
- U stuurt ons **uiterlijk 1 december 2020** een beknopte inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage. U gebruikt hiervoor de formulieren voor 'Voortgang project en melden wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies' (www.noord-holland.nl) onder 'Algemene subsidieformulieren';
- U voert de activiteiten uit tussen 1 juli 2020 en 31 maart 2022;
- U houdt het wandelnetwerk minimaal 15 jaar in stand;
- U houdt de TOP's minimaal 10 jaar in stand.

Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening van provincies en gemeenten gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In verband met aangescherpte eisen ten aanzien van subsidies zullen wij u op grond van artikel 4:37 van de Awb aan het einde van het jaar een rapportage over de voortgang van uw project vragen. Dit betreft een onderbouwde (bewijsbare) stand van zaken van de inhoudelijke realisatie en de daarvoor gemaakte kosten van uw project in het afgelopen jaar. Wij vragen u hier rekening mee te houden en uw projectadministratie op deze manier in te richten.

Mogelijke vergunningen

U geeft aan dat voor de activiteiten geen (omgevings-)vergunning nodig is. Mogelijk heeft u een andere vergunning of een ontheffing nodig voor uw project. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende aanvragen voor een vergunning of ontheffing automatisch zijn goedgekeurd.

Voorschot

Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot bedraagt € 272.744.--, dat wil zeggen 80% van het maximum van de aan u verleende subsidie. Dit voorschot wordt in onderstaande termijnen, gebaseerd op het door u opgegeven kasritme, overgemaakt op IBAN NL88 INGB 0654937877 onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

- september 2020 € 110.744,--
- april 2021 € 162.000,--

Afhankelijk van de voortgang van het project kan dit betalingsritme worden aangepast.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie

U bent verplicht om binnen 13 weken na afloop van de activiteiten bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 31 maart 2022 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval **uiterlijk op 30 juni 2022** deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.

Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- *Een ondertekende opgave* van de verrichte activiteiten en de daarvoor gemaakte kosten. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag vaststelling subsidie en Eindrapportage, te downloaden via het Digitaal Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl);
- *Een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag*, opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor kunt u gebruik maken van het format controleverklaring, te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies/Algemene formulieren' (www.noord-holland.nl).

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van de financiële verantwoording.

Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige) inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve subsidiebedrag.

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Regelgeving

Hierboven is de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 genoemd. Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies op de website www.noord-holland.nl.

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl).

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unitmanager Subsidies
dhr. drs. A.D. Teerlink

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Bestuursvoorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Datum vergadering	
Adviescommissie	28 oktober 2019
Dagelijks bestuur	14 november 2019
Algemeen bestuur	12 december 2019

Onderwerp
Inrichting en beheer regionale routenetwerken varen, wandelen, fietsen en TOP's

Kernboodschap
<p>In dit voorstel wordt de betrokkenheid van Recreatieschap Spaarnwoude bij regionale routenetwerken in de regio Zuid-Kennemerland voor de komende jaren geschetst. Regionale routenetwerken verbinden steden en dorpen aan natuur- en recreatiegebieden en het omringende cultuurlandschap en passen hiermee in het beleid van de provincie Noord-Holland en de Metropool Regio Amsterdam.</p> <p>De kosten voor de ontwikkeling en beheer van routenetwerken zijn voor het recreatieschap budgettair neutraal, maar vormen voor de gemeenten wel een structurele extra kostenpost. Voor de provincie Noord-Holland is het een incidentele kostenpost. De provincie draagt 50% van de inrichtingskosten van het Wandelnetwerk en 75% van de Toeristische Overstap Punten. De overige inrichtingskosten worden door de betrokken regiogemeenten gedragen. De andere terrein behorende organisaties (PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland) dragen bij aan de onderhoudskosten van de routenetwerken binnen hun eigen gebieden.</p>

Het algemeen bestuur besluit
<ol style="list-style-type: none">In te stemmen met de centrale uitvoering van het:<ol style="list-style-type: none">Beheer Sloepennetwerk Zuid-Kennemerland per 2020.Beheer Wandelnetwerk en TOP's Zuid-Kennemerland per 2022.Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de omvorming van de Landelijke Fietsroutes (LF's) en het beheer van het bestaande Fietsknooppuntennetwerk in de regio.

Bestuurlijke achtergrond
<p><u>Provincie Noord-Holland</u></p> <ul style="list-style-type: none">20-10-2010 is door de staatssecretaris van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid een akkoord gesloten met de voorzitter van het Inter Provinciaal Overleg waarin decentralisatie van taken op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering voor natuur en recreatie van het Rijk naar de provincies is geregeld.Eind 2012 is de Agenda Groen verschenen voor de periode 2013-2016. Hierin is opgenomen dat er sterker ingezet gaat worden op de realisatie van routenetwerken voor wandelen en fietsen en Toeristische overstap punten (TOP's).In 2016 is de visie Waterrecreatie Noord-Holland 2030 vastgesteld. De provincie wil graag een toonaangevende watersport provincie blijven. Sloepen vormen een groei segment in de waterrecreatie sector en de realisatie van een provincie dekkend Sloepennetwerk is één van de beleidsdoelen.

- Het programma natuurontwikkeling 2019-2023 beschrijft onder andere de doelen het Wandelnetwerk Noord-Holland te willen completeren door de regio's Zuid-Kennemerland en Texel te subsidiëren. Hetzelfde geldt voor TOP's. De subsidieregelingen hiervoor zijn gecontinueerd.

Gemeenten

- De gemeenten werken o.a. samen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en hebben op het beleidsterrein Recreatie en Toerisme de ambitie te komen tot een uitmuntend netwerk voor fietsen, wandelen en varen en spreiding van bewoners en bezoekers over de hele regio.

Recreatieschap

- 17 december 2015 is besloten een bijdrage te leveren in de beheerkosten voor het **Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland**. De gemeente Velsen betaalt hiervoor een aanvullende bijdrage aan het recreatieschap.
- Op 11 juli 2019 heeft het bestuur van Spaarnwoude besloten. In te stemmen met de vrijgave van de conceptvisie Spaarnwoude Park op hoofdlijnen voor een oordeels- en besluitvormende bijeenkomst met raden- en Statenleden (gepland op 23 september 2019, bijeenkomst als aangekondigd op de werkconferentie van 6 februari 2019), met als belangrijkste punten:
 - a) de vier pijlers uit de doelenboom;
 - i. Verrassender landschap
 - ii. Beter verbindingen**
 - iii. Wervende activiteiten
 - iv. Bredere sociale betrokkenheid
 - b) de daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;
 - i. Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en historische landschaplijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden
 - ii. Verbindingen met de steden**
 - iii. Zonering en onderverdeling in gebieden waar meer activiteiten komen, met de daarbij horende methodiek van kamers en kavelspaspooten.

Onderbouwing besluit

Ad 1 Beheer sloepen- en Wandelnetwerk, TOP's

Inleiding (financiering) routenetwerken

De provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam streven naar een uitmuntend routenetwerk voor fietsen, wandelen en varen. Dit beleid past volledig binnen de kaders van de visie Spaarnwoude Park waarin voor dit type projecten (Beter verbindingen naar en in het gebied) gedefinieerd is dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor provincie, gemeenten en recreatieschap (zie bijlage 1). Het Routebureau VAN RNH spant zich in om een grote rol te spelen in de ontwikkeling, inrichting, beheer en promotie van fiets-, wandel- en vaarnetwerken en Toeristische Overstap Punten om daarmee beleidsdoelen van provincie, gemeenten en recreatieschappen te realiseren.

Er is samenhang in het netwerk over infrastructuur van alle regionale bestuursorganen en publieke en private terreinbeheerders. Het voorzien in recreatiemogelijkheden is een gemeenschappelijke inspanning van alle actoren in de regio. Hieronder staan de relevante ontwikkelingen bij de recreatienetwerken in de regio en hoe Spaarnwoude aansluit op steden, dorpen, natuurgebieden en agrarisch cultuurlandschap.

Voor Recreatieschap Spaarnwoude zijn de kosten en baten in evenwicht. De aan RNH te betalen kosten voor beheer, onderhoud en promotie van de routenetwerken voor sloepen en wandelen worden volledig gedekt uit de extra doelbijdragen van de vier gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen.

Wandelnetwerk

Er is een quick scan dd. uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen en Zandvoort. Intentie is het Wandelnetwerk Noord-Holland aan te vullen aan de zuidwestflank van de provincie. In de periode tot eind 2021 wordt 660 km wandelroutes aangelegd. Eind 2019 verwachten we dat de financiering voor de realisatie van het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland inclusief toeristische overstap punten (TOP's) Zuid-Kennemerland rondkomt. De kosten daarvoor zijn in totaal gecijferd op circa € 770.000 exclusief btw. De provincie kan volgens haar subsidieregelingen circa € 420.000 bijdragen. De gezamenlijke gemeentelijke bijdrage is circa € 350.000. De realisatie van het Wandelnetwerk loopt buiten het uitvoeringsprogramma van het Recreatieschap. Dit is een project in de uitvoeringsprogramma's van de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten.

De toekomstige beheerlasten, prijspeil 2022, is gecijferd op afgerond € 100.000 inclusief btw. PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland dragen € 8.000 bij in natura, door uitvoering van onderhoudsmaatregelen door eigen personeel en vrijwilligers. De gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort dragen samen € 20.000 bij. De vier in Spaarnwoude deelnemende gemeenten dragen samen € 72.000 van deze kosten. Zij wensen de betaling voor het beheer aan Recreatieschap Spaarnwoude doen. In bijlage 2 is een tabel opgenomen waarin per gemeente de te betalen bedragen zijn vermeld.

Sloepennetwerk

Het Sloepennetwerk Zuid-Kennemerland is in 2018/2019 gereedgekomen. Dit was een investering van € 67.000. 45% gesubsidieerd door de provincie en 55% betaald door Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Heemstede. Dit netwerk zal aan RNH in beheer gegeven worden. De gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam, Haarlem willen totaal € 11.081 bijdragen voor het beheer van dat netwerk via Recreatieschap Spaarnwoude bijdragen. De gemeente Heemstede zal haar bijdrage van € 1.308 rechtstreeks aan RNH gaan voldoen. De gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Velsen dragen niet bij aan inrichting en beheer van het Sloepennetwerk omdat dit hun gemeenten niet of nauwelijks aandoet.

Fietsknooppuntennetwerk

Het fietsknooppuntennetwerk is in deze regio in 2010 gereedgekomen. De gemeente Haarlem treedt op als beheerder van het fietsknooppuntennetwerk Zuid-Kennemerland mede voor de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het onderhoud is namens die gemeenten opgedragen aan de firma Brouwers uit Roermond. De Haarlemmermeerpolder is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk Amstelland en Meerlanden. Dat Fietsknooppuntennetwerk is in beheer van Groengebied Amstelland en Recreatieschap Spaarnwoude en daardoor operationeel in beheer van het Routebureau van RNH.

Ad 2 Ontwikkelingen Landelijke Fietsroutes

Nederland is geheel gedekt door een fietsknooppuntennetwerk. De landelijke fietsroutes (LF's) bedoeld voor fietsvakantiegangers zullen gemoderniseerd gaan worden. Het aantal wordt tot 2025 teruggebracht van 26 nu naar 11 straks. Dit gebeurt deels door samenvoeging van bestaande LF's en deels door verwijdering van bestaande. De routes gaan iconroutes heten. Meer informatie is te vinden op www.fietsplatform.nl/lf-iconroutes Zodra duidelijk is of en wat de consequenties zijn voor de beheerafspraken gefinancierd door gemeenten en recreatieschappen worden betrokken partijen door ons geïnformeerd.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel

- Is het beheer van de regionale routenetwerken binnen de grenzen van de in het Recreatieschap Spaarnwoude deelnemende gemeenten geregeld.

Indien u niet instemt met dit voorstel

- Moeten andere beheerafspraken met de gemeenten gemaakt worden om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidie van de provincie Noord-Holland.

Bijdrage aan schapsdoelen

- Duurzaam beheer bestaand gebied
- Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden
- Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
- Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing

Financiële consequenties: **(JA)**

Toelichting:

Financiële consequenties van de beslispunten (i = incidenteel, r = regulier)

LASTEN					
Deelprogramma (I/R)	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	Jaar T 2019	Jaar T+1 2020	Jaar T+2 2021	Jaar T+3 2022
5.7.1 Groen en Recreatie (nieuw)	Inzet RNH				
5.7.2 Groen en Recreatie (beheer) - Sloepennetwerk - Wandelnetwerk	bedrijfskosten	-	11.081 -	11.358 -	11.642 72.102
Totaal			11.081	11.358	83.744
Dekkingsbron			Aanvullende doel bijdrage gemeenten	Aanvullende doel bijdrage gemeenten	Aanvullende doel bijdrage gemeenten

De aanvullende doelbijdragen van de gemeenten voor beheer van het Sloepennetwerk en Wandelnetwerk met TOP's is in evenwicht met de kosten. Voor het recreatieschap dus budgettair neutraal.

Investeringsvoorstel: **nee**

Basisgegevens investering

Investeringsom	
Afschrijvingstermijn (jaar)	15 jaar
Kapitaallasten	n.v.t.
Aanvang Kapitaallasten	n.v.t.
Dekkingsbron	
Effecten op reserve (positief/negatief)	Neutraal

Communicatie

Binnen het schap:

- Opnemen in de bestuursmededeling
- Nieuwsbrief
- Internet
- Sociale media
- Persbericht
- Krant
- Anders
- N.v.t.

Buiten het schap:
Dialogo voeren met buurgemeenten en Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Objecten als informatiepanelen, knooppuntpanelen en kunstwerken worden voorzien van een opvallende sticker met websiteadres www.recreatienoordholland.nl/routes zodat mensen meldingen kunnen doorgeven.

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):
Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met medewerkers van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam,

Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met medewerkers van Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, HLT samen (Hillegom, Lisse, Teylingen)

Planning

- Beheer Sloepennetwerk start per 2020
- Realisatie WNW en TOP's Zuid-Kennemerland 2020 -2021
- Beheer WNW en TOP's Zuid Kennemerland start per 2022

Bijlagen

1. Kaart Sloepennetwerk Zuid-Kennemerland
2. Kaart Quick Scan Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland
3. Infographics routenetwerken 2018
4. Factsheet recreatief fietsen Noord-Holland 2019

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 7 oktober 2019
MT 8 oktober 2019

Advies AC 28 oktober 2019 en besluit DB

De **adviescommissie** adviseert de tabel investeringssom te verwijderen, om verwarring te voorkomen.

Besluit van DB wordt toegevoegd na vergadering dagelijks bestuur 14 november 2019.

Behandelaar

Alex Rohof, afdeling projecten, senior projectleider Routebureau

Akkoord

Programmamanager Bart van Dijk
Directeur RNH Jos Gilliam

Bijlage 4.

Bestuursbesluit AB SPW december 2019



Nummer: 2019/33

Onderwerp: **Inrichting en beheer regionale routenetwerken varen, wandelen, fietsen en TOP's**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 14 november 2019

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 28 oktober 2019

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

1. **In te stemmen met de centrale uitvoering van het:**
 - 1.1 **Beheer Sloepennetwerk Zuid-Kennemerland per 2020.**
 - 1.2 **Beheer Wandelnetwerk en TOP's Zuid-Kennemerland per 2022.**
2. **Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de omvorming van de Landelijke Fietsroutes (LF's) en het beheer van het bestaande Fietsknooppuntennetwerk in de regio.**

Velsen-Zuid, 12 december 2019
Akkoord directeur RNH


J.J.L. Gilliam

Akkoord voorzitter


J. Chr. van der Hoek
